



Fundusze Europejskie

dla Kujaw i Pomorza  
2021-2027

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI WIELOLETNIEGO PLANU DZIAŁAŃ  
DLA PROGRAMU FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA KUJAW I POMORZA NA  
LATA 2021-2027  
za ROK 2023 r.**

zatwierdzone Uchwałą nr 10/484/24

Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

z dnia 6 marca 2024 r.



Fundusze Europejskie  
dla Kujaw i Pomorza



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



Samorząd Województwa  
Kujawsko-Pomorskiego

Sprawozdanie z realizacji *Wieloletniego planu działań dla Programu FEdKP 2021-2027* za rok 2023 odnosi się do wartości określonych dla roku 2023 w dokumencie przyjętym uchwałą Nr 27/1445/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 lipca 2023 r. Bazą do wyliczeń był Harmonogram naborów przyjęty przez Zarząd Województwa uchwałą nr 26/1315/23 z dnia 28 czerwca 2023 r. (obowiązywał od 30.06.2023 r. do 25.07.2023 r.).<sup>1</sup> Wyliczenia do sprawozdania zostały przeprowadzone na podstawie danych z CST2021.

## NABORY

Harmonogram naborów zakładał, że w 2023 r. zostanie ogłoszonych 118 naborów o wartości dofinansowania UE 4 162 507 669 zł. W 2023 r. zostało skutecznie ogłoszonych 88 naborów<sup>2</sup>, co stanowi 75% liczby zaplanowanych w harmonogramie naborów, dofinansowanie UE w ogłoszonych naborach wynosiło 2 774 633 025,95 zł, co stanowi 67% kwoty dofinansowania UE w zaplanowanych naborach. Kwoty z naborów uwzględnione w *Wieloletnim planie działań dla Programu FEdKP 2021-2027* do wyliczenia przyszłej kontraktacji zostały skorygowane do wysokości 3 507 872 630,62 zł. Racjonalizacja kwot mających wpływ na kontraktację i później księgowanie wydatków do KE uwzględniała ryzyko przesunięć naborów i usuwania naborów z harmonogramu. Wartość dofinansowania UE w ogłoszonych naborach w stosunku do kwoty uwzględnionej w planie wieloletnim wynosi 79%.

W ramach **EFS+** ogłoszono 38 naborów o łącznej wartości alokacji 766 072 071 zł.

W ramach **EFRR** ogłoszono 50 naborów o łącznej wartości alokacji 2 008 560 953,36 zł.

Dofinansowanie ogółem (UE+BP) w skutecznie ogłoszonych naborach wynosiło 2 849 178 287 zł a we wnioskach złożonych w ramach tych naborów wynosi 2 020 966 273 zł, co daje potencjalne wykorzystanie alokacji dofinansowania w tych naborach na poziomie 71%.

## KONTRAKTACJA

Plan działań zakładał, że przyrost kontraktacji w 2023 rok, wyniesie łącznie 15% alokacji Programu tj. 1 261 144 987,26 zł i został zrealizowany w 96,8% założonego celu tj. zakontraktowano środki UE w wysokości 1 221 211 193,72 zł.

---

<sup>1</sup> Alokacja dla Programu wyliczana dla WPD i Harmonogramu przeliczana wg kursu na dzień sporządzenia harmonogramu 4,5235zł/ euro.

<sup>2</sup> Nabory bez unieważnionych

**W ramach EFRR:**


- założono, że zakontraktowane zostaną środki UE na poziomie 20% alokacji EFRR, tj. 1 178 342 970 zł,
- zakontraktowano środki UE w wysokości 991 364 143,33 zł, co stanowi 84% wyznaczonego celu i 17,2% alokacji EFRR (liczonej po kursie na dzień sporządzenia sprawozdania, tj. 4,3355). Kontraktacja została zrealizowana w zakresie:
  - ✓ IP ZIT EFRR - w wysokości 88 737 325,29 zł, co stanowi 184% założonego celu,
  - ✓ IZ EFRR - w wysokości 73 396 003,40 zł, co stanowi 25% założonego celu,
  - ✓ IF - w wysokości 829 230 814,64 zł, co stanowi 99% założonego celu (różnica wynika z kursu euro przyjętego do harmonogramu i kursu z dnia podpisania umowy).


**W ramach EFS+:**

- założono, że zakontraktowane zostaną środki na poziomie 4% alokacji EFS+, tj. 82 802 017,08 zł,
- zakontraktowano środki UE w wysokości 229 847 050,39 zł, co stanowi 278% wyznaczonego celu i 10% alokacji EFS+ (liczonej po kursie na dzień sporządzenia sprawozdania, tj. 4,3355). Kontraktacja została zrealizowana przez:
  - ✓ IP ZIT EFS+ - w wysokości 655 889,97 zł, co stanowi 15% założonego celu<sup>3</sup>,
  - ✓ IP WUP EFS+ - w wysokości 128 367 992,20 zł, co stanowi 299% założonego celu,
  - ✓ IZ EFS+ - w wysokości 100 823 168,22 zł, co stanowi 285% założonego celu.

---

<sup>3</sup> W ramach EFS+ IP ZIT podpisało 2 umowy o dofinansowanie w roku 2023 na kwotę 1 190 166,30 zł UE, to jest w ramach działania 8.12 na kwotę 655 889,99 zł (ujęte w sprawozdaniu) oraz 534 276,31 zł w ramach działania 8.15 nie ujęte w sprawozdaniu, ponieważ nie zostało wprowadzone do CST2021 – co stanowi 26,3 % założonego celu.

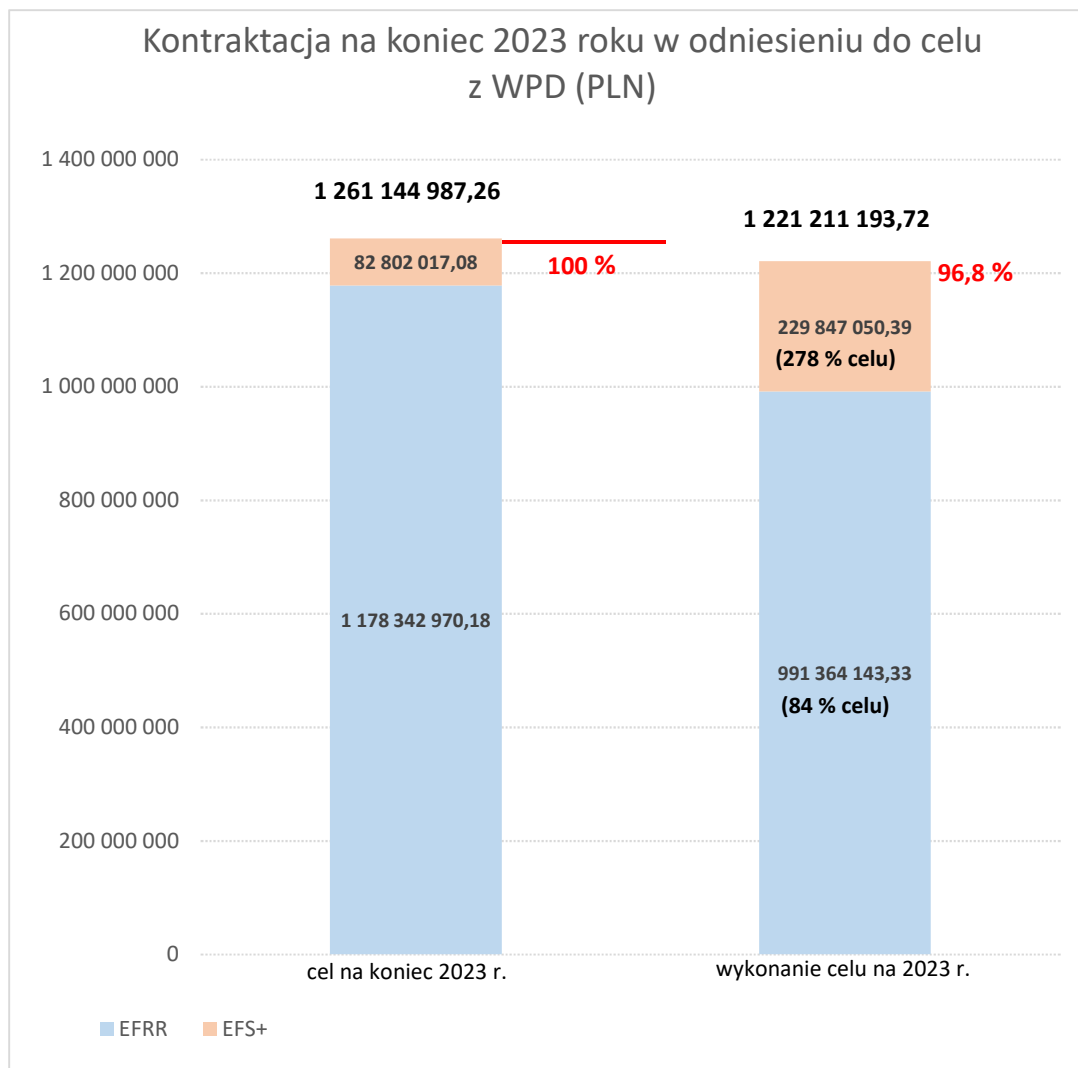

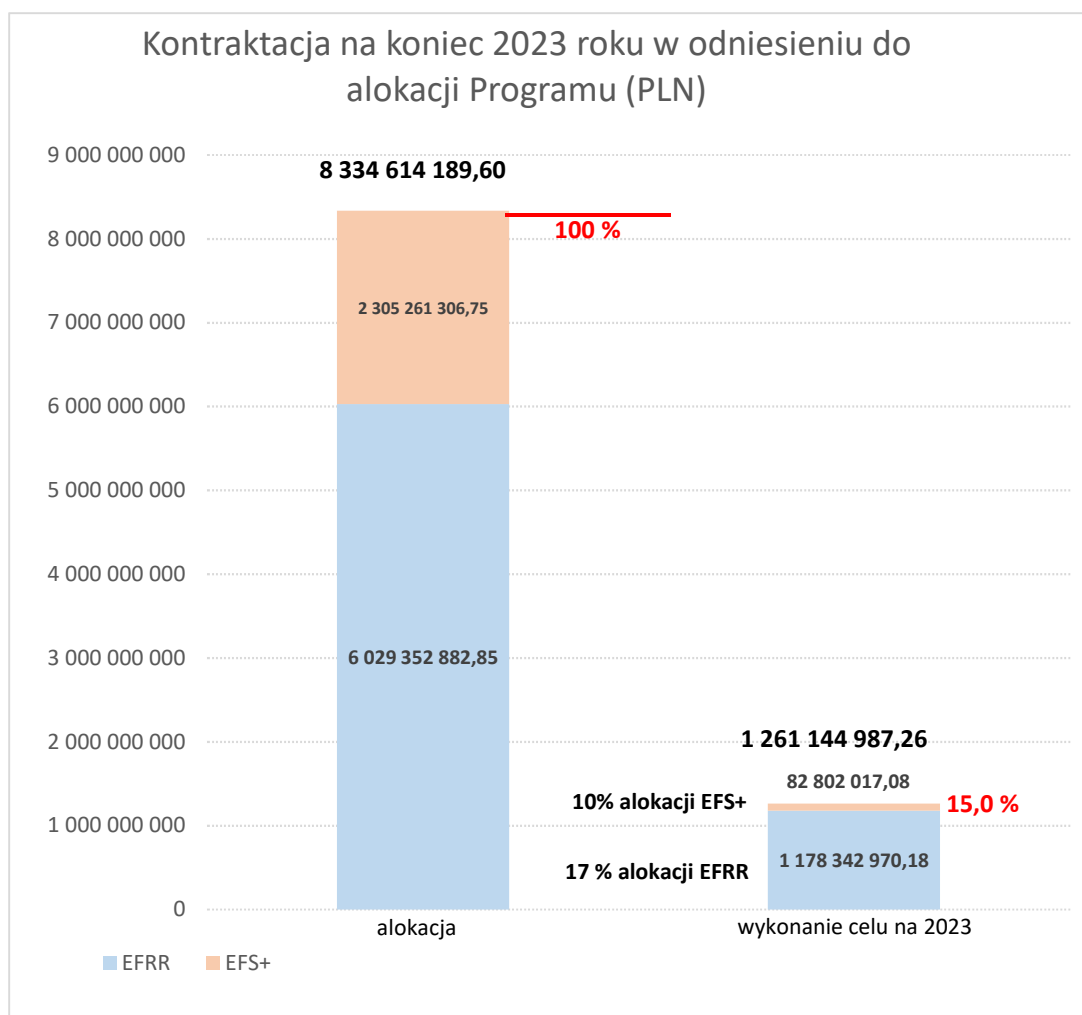

### Podsumowanie kontraktacji:

Wartość zakontraktowanych w 2023 r. środków w ramach EFRR wynosiła 991 364 143,33 zł, co przełożyło się na realizację zaplanowanego celu w 84%, natomiast wartość zakontraktowanych środków w ramach EFS+ stanowiła kwotę 229 847 050,39 zł, co przełożyło się na realizację zaplanowanego celu w 278%. Wartość kontraktacji (łącznie 1 221 211 193,72 zł) stanowi 15% alokacji przyznanej na realizację Programu, zatem planowany przyrost kontraktacji na poziomie 15% został zrealizowany. Kontraktacja powyżej oczekiwanych wartości w ramach IP ZIT EFRR oraz IZ EFS+ i IP WUP EFS+ zrównoważyły niedobory kontraktacyjne w ramach IZ EFRR i IP ZIT EFS+.

### **KSIĘGOWANIE WYDATKÓW DO KE (CERTYFIKACJA)**

W Planie działań na 2023 rok przyjęto za cel zaksięgowanie wydatków w wysokości 1% alokacji Programu, tj. 85 801 248,75 zł, w tym w ramach EFRR kwoty 61 986 755,75 zł (w zakresie IF) i w ramach EFS+ kwoty 23 814 493 zł (w zakresie działań IP WUP). Z uwagi na niespełnienie trzech warunków podstawowych na poziomie kraju (w zakresie transportu, zdrowia oraz Karty Praw Podstawowych) nie

było możliwe księgowanie żadnych wydatków w ramach Programu. Cel związany z księgowaniem wydatków do KE nie został spełniony, jednak potencjał w złożonych przez beneficjentów i zatwierdzonych wnioskach o płatność wynosi 89 713 762 zł, co stanowi 105%<sup>4</sup> założonego celu. Wszystkie wydatki, które były planowane do zaksięgowania do KE w 2023 r. będą przekazane we wnioskach do KE w 2024 roku, po potwierdzeniu spełnienia warunków podstawowych.

## REALIZACJA FEdKP 2021-2027 NA TLE INNYCH PROGRAMÓW REGIONALNYCH W KRAJU.

W załączniku nr 4 przedstawiono poziom realizacji programów regionalnych w poszczególnych województwach ze stanem na 31.12.2023 r. Województwo Kujawsko-Pomorskie kontraktując do końca 2023 roku 15% alokacji Programu wygenerowało potencjał do księgowania wydatków do KE na poziomie 1%, co daje 7% skuteczność rozliczania środków w Programie. Nie uwzględniając wniosków rozliczanych w ramach IF (we wszystkich województwach) skuteczność ta waha się od 0% w woj. Mazowieckim do 28,1% w woj. Pomorskim, średnia wynosi 3,8% a w woj. Kujawsko-Pomorskim wynosi 2,3%. Plasuje to nasz region na 5 pozycji w kraju.

## WNIOSKI I REKOMENDACJE

### Zdiagnozowane problemy:

- brak gotowości potencjalnych beneficjentów, w tym niektórych projektów własnych do złożenia wniosków (w zakresie EFRR), co skutkuje wydłużaniem i przekładaniem terminów ogłaszania naborów,
- decyzja o unieważnieniu przetargu na zakup nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych wraz ze świadczeniem usług serwisowych w okresie 96 miesięcy w dniu 11 sierpnia 2023 r. spowodowała brak złożenia wniosku o dofinansowanie i brak kontraktacji w trybie niekonkurencyjnym w zakresie EFRR na kwotę 192 210 050 zł z 2023 r.
- przedłużająca się w czasie decyzja odnośnie rozstrzygnięcia w naborze dla działania 8.24 (Centra Usług Społecznych) o dużym zainteresowaniu wnioskodawców, co przełożyło się na dalsze procesy, tj. ocenę wniosków oraz negocjacje,
- zmiany w zakresie podstawy prawnej udzielania pomocy de minimis w programach regionalnych 2021-2027 skutkujące zmianami w kryteriach wyboru projektów oraz regulaminach wyboru projektów co w konsekwencji przełoży się na odroczenie zakończenia oceny projektów i ich kontraktację,

---

<sup>4</sup> Na kwotę składają się zatwierdzone wnioski o płatność IP WUP oraz wnioski zaliczkowe IF w wysokości założonego celu na 2023. Całkowity potencjał w zatwierdzonych wnioskach o zaliczkę IF wynosi 227 490 169,04zł.

- niski potencjał kadrowy niektórych wnioskodawców dla przygotowania projektów własnych,
- brak możliwości księgowania wydatków do KE, z uwagi na niespełnienie 3 warunków podstawowych na poziomie kraju,

#### Rekomendacje:

- niewydłużanie terminów składania wniosków w ogłoszonych naborach<sup>5</sup>,
- pilne uzupełnienie braków kadrowych wykwalifikowanym personelem niektórych beneficjentów projektów własnych tj. departamentów urzędu, spółek prawa handlowego z większościowym udziałem WK-P, również nowo powstałych jednostek np. wojewódzkich instytucjach kultury – w szczególności dotyczy to przedsięwzięć strategicznych/priorytetowych dla WK-P (np. Kujawsko-Pomorskie Centrum Naukowo-Technologiczne sp. z o.o. im. prof. Jana Czochrańskiego),
- utrzymanie tempa kontraktacji projektów przez IP WUP oraz IP ZIT BydOF,
- przyspieszenie podejmowania decyzji ZW o zwiększeniu alokacji w naborze w przypadku naborów o dużym zainteresowaniu wnioskodawców,
- monitorowanie relacji pomiędzy kontraktacją i księgowaniem wydatków do KE na tle innych regionów,
- planowanie w harmonogramie terminów naborów odbywać się będzie w miarę możliwości uwzględniając nakładanie się terminów naborów i obciążenie pracą w wydziałach odpowiedzialnych za ocenę i wybór projektów w DW FEdKP, w celu uniknięcia spiętrzenia prac i wydłużenia procesu oceny,
- zorganizowanie szkoleń dla wnioskodawców, w szczególności z obszarów generujących problemy (m.in. polityki horyzontalne, zasady doboru wskaźników realizacji projektu i ich źródeł pomiaru, zasady konstruowania budżetu projektu w systemie SOWA EFS+), w celu poprawy jakości przygotowywanych wniosków o dofinansowanie.

---

<sup>5</sup> W przypadku IP ZIT BydOF możliwość wydłużenia terminu każdorazowo po uzgodnieniu z IZ FEdKP, w celu sprawnej realizacji Strategii ZIT

Załączniki:

1. Tabela: „Sprawozdanie z realizacji WPD dla EFdKP 2021-2027 za 2023 rok.”
2. Tabela: „Realizacja założeń WPD w ramach EFdKP 2021-2027 dla 2023 r.”
3. Tabela: „Stan realizacji oraz % wykorzystanej alokacji FEdKP 2021-2027 w podziale na priorytety (stan na 31.12.2023)”.
4. Tabela: „Realizacja Funduszy Europejskich dla województw na lata 2021-2027 (stan na 31.12.2023 r.) - na podstawie danych wygenerowanych w dniu 01.01.2024 r.”

Przygotował:

Departament Zarządzania FEdKP

Wydział Analiz i Ewaluacji
